



BENDUNGAN RANDUGUNTING

PROGRES BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI JUANA

Semarang, 30 SEPTEMBER 2021

Status 14.00

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA 2021 PER BALAI




eMONITORING ONLINE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Status: 30 September 2021

NO	BBWS/BWS/PUSAT/SKPD TPOP	Pagu (dlm ribuan)		Progres (dlm %)	
		DIPA	REALISASI	Keu	Fisik
1	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	3.291.746.227	2.627.066.505	79,81	82,91
2	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak	2.042.541.039	1.570.830.989	76,91	80,87
3	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	2.162.327.341	1.642.777.154	75,97	73,99
4	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana	2.918.514.546	2.034.930.900	69,72	70,74
5	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	1.693.664.405	1.158.830.108	68,42	76,26
6	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang	1.556.298.196	1.026.061.826	65,93	67,09
7	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	2.022.669.235	1.324.936.015	65,50	79,72
8	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	2.230.551.924	1.416.609.950	63,51	73,22
9	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	2.648.714.964	1.657.766.526	62,59	72,21
10	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	1.365.631.542	807.981.981	59,17	63,81
11	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian	1.398.846.687	758.019.064	54,19	56,76
12	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	2.190.332.287	1.160.100.144	52,96	52,74

GRAFIK PROGRES BBWS SDA PUPR

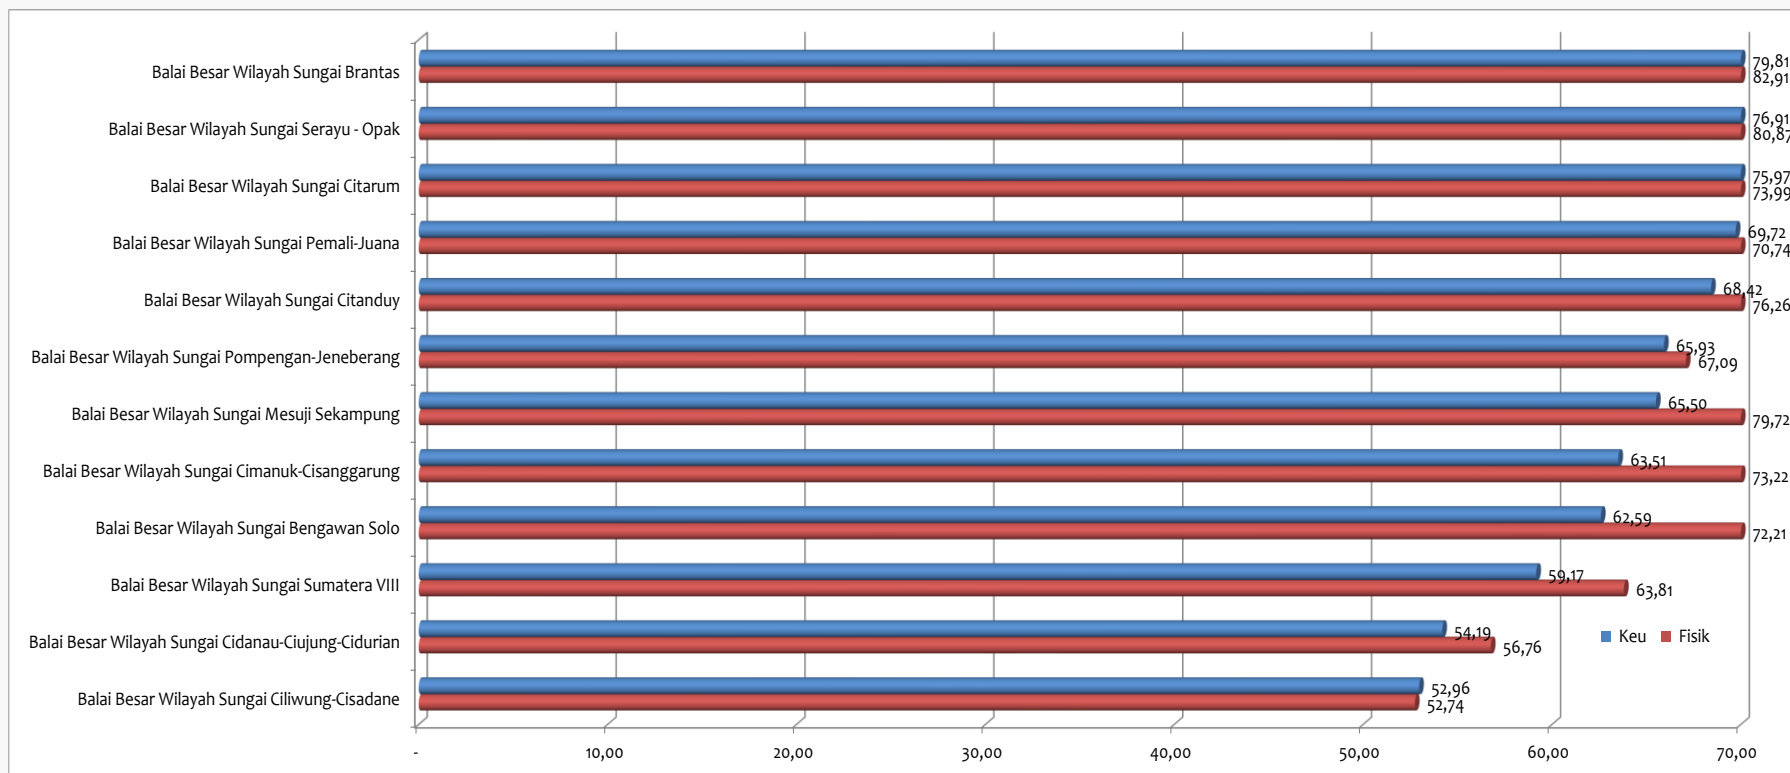

Progress Fisik dan Keuangan BBWS Pemali Juana

periode

30 SEPTEMBER 2021

Total alokasi

2,918,514,546

Keu/Fis

69,72% / 71,20%

Total penyerapan

2,034,930,900

486,234,881

SNVT Bendungan

91.18% / 60.79%

455,139,121

68,724,097

Satker Balai

71,41/ 71,41%

49,073,082

450,607,359

Satker OPSDA

71,06% / 71,89%

320,197,116

666,542,174

SNVT PJPA

68,36% / 80.34%

455,629,830

348,179,603

SNVT ATAB

65,29 / 59,39%

227,318,594

898,226,432

SNVT PJSA

58,73 / 66,95%

527,573,157

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN BBWS PEMALI JUANA PER PPK

periode
30 SEPTEMBER 2021



eMONITORING ONLINE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	PPK	NAMA PPK	Pagu (dlm ribuan)	Progres (dlm %)	
				Keu	Fisik
1	PPK BENDUNGAN II	Rino Ariwibowo, ST, M.Eng	143.139.491	99,98	25,53
2	PPK BENDUNGAN I	Wahyu Apri Yoga, ST, MT	279.195.914	99,96	99,96
3	PPK AIR TANAH	Pandu Yuri Pratama, ST, MPSDA	15.211.114	83,12	83,15
4	PPK PSDA	Mytta Hardani Dirgantari, ST	4.420.680	79,37	79,37
5	PPK PAB (BMN)	Ali Rosidi, SE, MM	3.423.798	77,77	77,77
6	PPK OPSDA II	Rendra Arif Yudiarso, ST, MT	155.746.114	76,67	74,95
7	PPK OPSDA IV	Herdiana Kusumaningrum, ST, MT	116.621.181	76,00	76,58
8	PPK TATALAKSANA	Joko Hadinoto Wijoyo, ST, MT	37.634.600	74,58	74,58
9	PPK IRIGASI DAN RAWA III	Nugradi Dwi Isworo, ST	263.172.434	69,18	82,24
10	PPK PEMBINAAN DAN PERENCANAAN	Muchammad Arifin, ST, MT	30.558.276	65,22	90,42
11	PPK AIR BAKU	Chanif, ST, MT	332.968.489	64,47	58,30
12	PPK OPSDA III	Agnes Yustikarini Dian Iswari, ST, MT	130.943.597	64,10	68,47
13	PPK PERENCANAAN DAN PROGRAM	Dewi Shinta Rulisyani, ST	23.245.019	63,81	63,82
14	PPK SUNGAI PANTAI I	Fuad Kurniawan, ST, MT	426.382.913	62,35	71,62
15	PPK IRIGASI DAN RAWA I	Heri Santoso, ST, M.PSDA	203.477.399	60,27	68,33
16	PPK OPSDA I	Muhamad Hendrie Soesanto, ST	47.296.467	59,67	59,75
17	PPK SUNGAI PANTAI II	Dani Prasetyo, ST, MT	471.843.519	55,47	62,74
18	PPK IRIGASI DAN RAWA II	Kalmah, ST, M.Si, M.Sc	108.133.097	54,71	81,61
19	PPK DSE	Lesty Arlensitami, ST, M.Eng	33.341.200	39,02	54,31
					-
	TOTAL		2.918.514.546	69,72	71,20



TERIMA KASIH ...
